



Линиен календарен план

№	Вид изпълнявана дейност	Мярка	К-во	Екип	Бр. необходим и специалните раб./	Необходима механизация	Времетраене /кал./дни/	Продължителност (кал. дни)									
								5	10	15	20	25	29				
1	2	3	4		6	7	8	9									
	Обект: Етап Ia: „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ + 0+555.81/КК3/ км.“						29										
	ДЕЙНОСТ 1: Дейности до започване на СМР						2										
	Подписване на Двустранен протокол за започване изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка				-	-	1										
	Изясняване на всички съоръжения и инсталации, преминаващи в трасето на участъка, поставяне на временни ограждения и знаци, временно строителство и др. предварителни дейности			Екип Временно стр-во	4	-	1										
	ДЕЙНОСТ 2: Започване изпълнение на СМР, предмет на настоящата обществена поръчка																
	Подготвителни работи						25										
1	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на дърветата до 10см						3										
2	Транспортиране със самосвал на изсечени храсти - до 25 км	100м ²	24	Екип Подготовка	4	-	2										
3	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър до 45см	м ³	33		-	самосвал	2										
4	Изсичане единични дървета ръчно с диаметър 46-75см	бр.	15	Екип Подготовка	2	-	1										
5	Изкореняване и извличане на дънери изсечени дървета	бр.	8	Екип Подготовка	2	-	1										
6	Наговаряване дънери и изсечени дървета	м ³	9		-	трактор 90-110кс	1										
7	Транспортиране със самосвал на дънери и изсечени дървета - до 1км	м ³	9	Екип Подготовка	6	-	1										
	Почистване на речното корито - 277м						25										
1	Изкоп с багер земни маси от речното корито при 2 утежнени условия за направа на отбивна дига					багер гъс ход, булдозер											
2	Направа дига с булдозер Н=1,5м при 2 утежнени условия	м ³	2860		-	булдозер	4										
3	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - разваляне на отбивна дига	м ³	2860		-	булдозер	4										
4	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м ³	2860		-	самосвал	4										
5	Водочерпене			Екип Общи раб.	2		20										
6	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия на отвал	м ³	9538		-	багер гъс ход, булдозер	20										

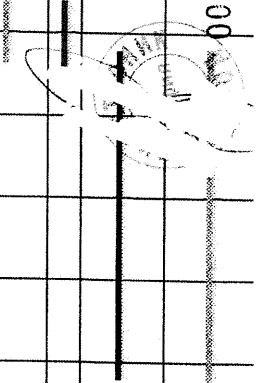

00000

7	Изкоп с багер земни маси при 2 утежнени условия - натоварване на самосвал	м ³	9538		-	багер с кофа	20			
8	Транспорт земни маси на 25 км на депо	м ³	9538		-	самосвал	20			
9	Услуга за депониране / 12398 м ³ x 1.80 = 22316.40 т. = 22316 т./	т	22316.00		-	-	22			
10	Проект за временна организация на движението-съгласно помощна сметка	бр.	1	Екип ВОД	4	-	25			
	ДЕЙНОСТ 3: Довършителни работи. Почистване на строителната площадка. Предаване на обекта.									
	Довършителни работи-почистване на обекта и премахване временно строителство и ограждения; извършвания на проби и замервания, отстраняване на пропуски и забележки.			Екип Временно стр-во	4	-	1			
	Подписване без забележки от инвеститорския контрол, авторския надзор и възложителя на Констатилен протокол за качеството и количествата на извършените работи.				-	-	1			



00993
